

 		DOCUMENTO DE APOIO	PAGINA	1/31
		RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS	Versão	00
			Data	04/04/2016
			DOCUMENTO DA.COM.001	

RELATÓRIO MENSAL

- CONCESSIONÁRIA: VIA 040
- RODOVIA: BR-040
- TRECHO: GO/DF/MG
- EXTENSÃO: 936,80 KM

Nova Lima – MG

Março de 2016

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	2/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
			DOCUMENTO N° DA.COM.001	

1. Introdução
 - 1.1. Informações Contratuais
 - 1.2. Localização
2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras
 - 2.1. Descrição das Principais Obras
 - 2.2. Localização das Obras
 - 2.3. Marcos Contratuais
 - 2.4. Relação de Equipamento e Pessoal
3. Avanço Físico
4. Relatório Fotográfico
5. Considerações Finais
6. Termo de Encerramento

		DOCUMENTO DE APOIO	Folha N°:	3/31
		RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS	Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
			DOCUMENTO N° DA.COM.001	

1. Informações da Concessão

1.1. Introdução

Dos trechos remanescentes da primeira fase de ampliação da rodovia, foram concluídas as obras de duplicação em Minas Gerais. Os trabalhos continuam em Goiás. Os segmentos, que somam 13,9 quilômetros, se somarão aos 56,3 quilômetros já duplicados.

A Concessionária trabalha na construção de obras de arte especiais. Em Goiás, estão em construção duas interconexões, nos quilômetros 27 e 33. Também estão em andamento as obras de quatro retornos em nível, nos quilômetros 71, 115 e 122, em Goiás, e no Km 172, em Minas Gerais. Em Ribeirão das Neves (MG), no Km 507, está em andamento a elaboração do projeto de construção de uma passarela.

Outra frente de trabalho em andamento refere-se à modernização das estruturas definitivas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Desde janeiro de 2016, foram entregues aos usuários seis postos de atendimento modernizados. Os trabalhos ocorrem em outras 13 estruturas ao longo do trecho sob concessão.

Estão em fase de execução os projetos de reforma e construção de cinco postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além dos estudos para construção de três postos de pesagem na BR-040.

Finalizados os 10% iniciais de obras de duplicação, os trabalhos de recuperação e conservação seguem sendo executados. Pavimento, sinalização, sistemas de drenagens, faixa de domínio e demais estruturas da rodovia recebem continuamente intervenções, conforme contrato de concessão.

 	 <small>AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES</small>	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	4/31
		RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
				Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

  	DOCUMENTO DE APOIO	Folha Nº:	5/31	
		RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS	Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	


1.2. Informações

Contratuais

DADOS CONTRATUAIS		VIA 040
Concessionária	Concessionária BR 040 S/A	
Contrato Nº	Leilão 006/2013 ANTT	
Escopo do Contrato	Recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço	
Data da Assinatura do Contrato	12/03/2014	
Data de Início da Concessão	22/04/2014	
Início da Cobrança de Pedágio	-	
Rodovia	BR 040 DF/GO/MG	
Trecho	Brasília/DF - Juiz de Fora/MG	
Extensão (km)	936,80	
Prazo	30 anos	

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	6/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

1.3. Mapa de Situação

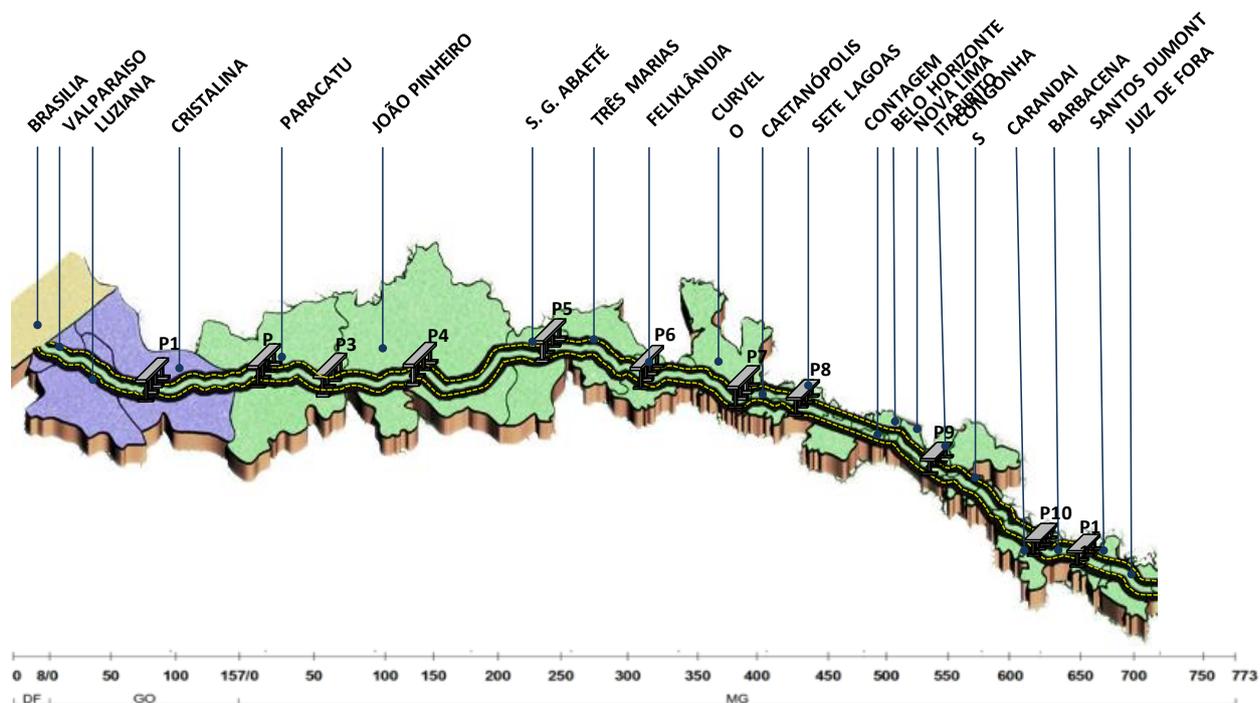

Trecho 01	Km 33,5/GO ao 40,5/GO
Trecho 02	Km 51,5/GO ao 58,2/GO
Trecho 03	Km 69,5/GO ao 74,5/GO
Trecho 04	Km 79,0/GO ao 88,8/GO
Trecho 05	Km 105,3/GO ao 130,3/GO
Trecho 06	Km 160,0/MG ao 168,6/MG

PRACA	Km	MUNICIPIO	UF
P1	93,3	CRISTALINA	GO
P2	18,0	PARACATU	MG
P3	91,3	LAGOA GRANDE	MG
P4	172,6	JOÃO PINHEIRO	MG
P5	251,5	S. GONÇALO DO ABAETÉ	MG
P6	328,7	FELIXLANDIA	MG
P7	405,4	CURVELO	MG
P8	487,4	CAPIM BRANCO	MG
P9	577,5	ITABIRITO	MG
P10	643,0	CONS. LAFAIETE	MG
P11	714,1	BARBACENA	MG

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	7/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
			DOCUMENTO N° DA.COM.001	

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

A **Via 040** concluiu todas as obras previstas para a primeira etapa da concessão da BR-040. Foram finalizados os trabalhos iniciais de recuperação, duplicados 60,7 quilômetros da rodovia e concluídas e homologadas as 11 praças de pedágio.

2.1. Descrição das Principais Obras

Obras de Duplicação

Atualmente, obras de duplicação estão em andamento em Luziânia (GO), entre os quilômetros 24,8 e 33,5. Neste trecho, o andamento dos trabalhos é: 100% de conclusão dos serviços preliminares; 91% de conclusão dos trabalhos de terraplenagem; 90% de conclusão das obras de pavimentação; 90% das obras de drenagem; 38% de conclusão das obras complementares. No cálculo geral, a duplicação do trecho está com 79% de evolução.

No trecho remanescente da duplicação em João Pinheiro (MG), entre os quilômetros 160 e 164,4, os trabalhos foram concluídos. Os dois trechos, que somam 13,9 quilômetros de extensão, se juntarão ao segmento duplicado de 56,8 quilômetros entregue em julho de 2015, que corresponde aos 10% iniciais de obras de ampliação previstas em contrato.

Obras de Arte Especiais

Estão em construção duas interconexões, nos quilômetros 27 e 33, em Luziânia (GO), obras que integram a duplicação do trecho. No Km 27, foram concluídos os serviços preliminares. A construção da obra de arte especial que integra o sistema está com 64% de avanço. No Km 33, a interconexão tem 100% dos serviços preliminares concluídos; 56% da obra de arte especial; e 16% dos trabalhos de terraplenagem. A interconexão do Km 27 tem avanço geral de 30%, ao passo que no Km 33 esse índice é de 31%.

Estão em curso também a construção de vias marginais, nos sentidos Norte e Sul, entre os quilômetros 24 e 19, em Luziânia (GO). No sentido Sul, foram executados 83% dos serviços preliminares; 14% dos trabalhos de terraplenagem; e 40% de obras complementares, totalizando 11% de avanço geral. No

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	8/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
			DOCUMENTO N° DA.COM.001	

sentido Norte, foram concluídos 82% dos serviços preliminares; e 15% das obras de terraplenagem, totalizando 6% de avanço global.

Estão em execução as obras de construção de três retornos em nível em Cristalina (GO), nos quilômetros 71 (2% de avanço geral); 115 (1% de avanço geral); e 122 (1% de avanço geral). No Km 172, em João Pinheiro (MG), também está em andamento a construção de um retorno em nível, que apresenta 8,5% de evolução geral.

Está em execução o projeto de construção de uma passarela no Km 507, em Ribeirão das Neves (MG). A fase atual é de elaboração do projeto executivo, tendo sido concluídos os serviços preliminares e trabalhos de topografia e sondagem.

Modernização das estruturas dos SAUs

Desde o final de agosto de 2015, a Via 040 trabalha na modernização das estruturas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Até março de 2016, foram entregues seis postos modernizados, em Luziânia (Km 56); Cristalina (Km 96 e Km 148); Felixlândia (Km 362); Nova Lima (Km 569); e Barbacena (Km 709). As obras continuam em outros 13 postos ao longo do trecho sob concessão. A previsão é de que todas as edificações estejam em operação até abril de 2016. Andamento dos trabalhos abaixo:

SAU	Estado Atual
1	Serviços de terraplanagem e obras de drenagem;
2	Obras concluídas. Em operação;
3	Obras concluídas. Em operação;
4	Obras concluídas. Em operação;
5	Obras civis, de sinalização, segurança e iluminação em execução;
6	Obras civis e de drenagem em execução;
7	Serviços de pavimentação e obras civis em execução;
8	Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras civis em execução;
9	Serviços de pavimentação e obras civis em execução;
10	Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras civis em execução;
11	Obras civis e de drenagem em execução;
12	Obras concluídas. Em operação;

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	9/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

13	Serviços de pavimentação e obras civis em execução;
14	Serviços de pavimentação e obras civis em execução;
15	Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras civis em execução;
16	Serviços de drenagem e obras civis em execução;
17	Obras concluídas. Em operação;
18	Serviços de terraplenagem, drenagem e obras civis em execução;
19	Serviços de drenagem e obras civis em execução;
20	Obras concluídas. Em operação.

Reforma e Construção dos Postos da PRF

Foi iniciada a elaboração dos projetos de reforma de quatro postos da PRF, em Santa Maria, no Distrito Federal, e em Paracatu, Três Marias e Sete Lagoas, em Minas Gerais. Novos postos serão construídos em Cristalina (GO) e Carandaí (MG). Em janeiro de 2016 foram iniciados os projetos das edificações e dos pátios de recolhimento de veículos.

Recuperação do Pavimento

A **Via 040** recuperou 836,8 quilômetros de pavimento em Goiás e Minas Gerais. A recomposição das pistas envolve reconstrução de trechos deteriorados, eliminação de imperfeições na pista, como ondulações e degraus, recomposição de acostamentos e uso de revestimento que garanta a máxima aderência do pneu à pista de rolamento. Foram aplicados também mais de 1,7 mil toneladas de massa asfáltica na rodovia (CBUQ a frio) para a execução de reparos no pavimento. Estes aprimoramentos proporcionam maior segurança e fluidez ao tráfego de veículos, melhorando as condições das pistas.

Recuperação de Obras de Arte Especiais

171 obras de artes especiais presentes no trecho sob concessão foram recuperadas. As intervenções englobaram recomposição das juntas de dilatação e dos guarda-corpos, melhorias da sinalização horizontal e vertical, reconstrução da calçada, pintura e limpeza da construção, além de recapeamento.

  	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	10/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
				DOCUMENTO N° DA.COM.001

Sinalização

Com relação à sinalização vertical, 17 mil placas foram implantadas na rodovia. Sobre a sinalização horizontal, a revitalização das faixas pintadas na pista foi equivalente a 6.130 quilômetros lineares. Ainda nesse campo, foram instalados na rodovia 296.900 tachas e tachões refletivos.

Elementos de Proteção e Segurança

A **Via 040** alcançou, em janeiro, a instalação de 147.784 metros de defensas metálicas na rodovia, 3.400 metros de barreiras rígidas de concreto.

Manutenção e conservação

Até o momento, a Concessionária regularizou 438,4 mil metros de cercas e aceiros na rodovia. Além disso, promoveu a limpeza e manutenção de 4.887 equipamentos do sistema de drenagem da rodovia, que envolve bueiros, valetas e sarjetas, por exemplo. Também, foi executada a manutenção vegetal de 13.599 quilômetros lineares na BR-040, além da retirada de um volume de resíduos, como entulho, equivalente a 4.761 caminhões.

Localização das Obras

LOCALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-040/DF/GO/MG



Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Município	
		Km Inicial	Km Final		Cidade	Estado
3.2.1.1	Duplicação					
3.2.1.1	Trecho 6R	160+000	164+400	4,40	João Pinheiro	MG
3.2.1.1	Trecho 7	24+000	33+500	9,50	Luziânia	GO
-	Retornos em Nível					
-	Retorno em Nível	71+300			Cristalina	GO
-	Retorno em Nível	115+000			Cristalina	GO
-	Retorno em Nível	122+000			Cristalina	GO
-	Retorno em Nível	172+000			João Pinheiro	MG
3.4.4	SAUs Definitivos					
3.4.4	SAU-1	00+500			Val Paraíso	DF

  	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	11/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001

3.4.4	SAU-2	51+475		Luziânia	GO
3.4.4	SAU-3	96+061		Cristalina	GO
3.4.4	SAU-4	148+625		Cristalina	GO
3.4.4	SAU-5	43+102		Paracatu	MG
3.4.4	SAU-6	86+517		Paracatu	MG
3.4.4	SAU-7	130+565		João Pinheiro	MG
3.4.4	SAU-8	173+344		João Pinheiro	MG
3.4.4	SAU-9	223+564		João Pinheiro	MG
3.4.4	SAU-10	271+902		Três Marias	MG
3.4.4	SAU-11	314+947		Três Marias	MG
3.4.4	SAU-12	362+070		Felixlândia	MG
3.4.4	SAU-13	405+016		Curvelo	MG
3.4.4	SAU-14	448+000		Caetanópolis	MG
3.4.4	SAU-15	488+240		Capim Branco	MG
3.4.4	SAU-16	525+133		Contagem	MG
3.4.4	SAU-17	569+163		Nova Lima	MG
3.4.4	SAU-18	610+150		Congonhas	MG
3.4.4	SAU-19	660+460		Carandaí	MG
3.4.4	SAU-20	709+880		Barbacena	MG
3.4.4	SAU-21	747+700		Santos Dumont	MG

2.2. Marcos Contratuais

	LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS			Data:
				30/04/2015
Marco	Descrição da Obra	Dias	Data	
1	Duplicar 55,7 Km	30	30/05/2015	
2	Implantar 11 Praças de Pedágio	175	22/10/2015	
3	Trabalhos Iniciais	-8	22/04/2015	
4	Duplicar 109,0 Km	358	22/04/2016	
5	Duplicar 149,4 Km	723	22/04/2017	
6	Duplicar 149,4 Km	1088	22/04/2018	
7	Duplicar 149,4 Km	1453	22/04/2019	
8	Conversão de subtrecho multifaixa em via duplicada - 28,4 Km	358	22/04/2016	
9	Conversão de subtrecho multifaixa em via duplicada - 38,8 Km	723	22/04/2017	
10	Conversão de subtrecho multifaixa em via duplicada - 38,8 Km	1088	22/04/2018	
11	Conversão de subtrecho multifaixa em via duplicada - 38,8 Km	1453	22/04/2019	

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	12/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

2.3. Relação de Equipamentos e Pessoal

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL		
Item	Descrição	Quantidade
1	Pessoal	
1.1	Administrativo	437
1.2	Operacional	595
Total		1.032
2	Equipamentos	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	21
2.2	Motocicletas	2
2.3	Ambulâncias Resgate - Tipo C	21
2.4	Ambulâncias de Suporte é Avançado - Tipo D	7
2.5	Guinchos Leves	23
2.6	Guincho Pesado	8
2.7	Caminhão Pipa	6
2.8	Caminhão Munk	1
2.9	Caminhão para apreensão de animais	6
Total		95

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	13/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001

3. Avanço Físico

Trecho 6 - Remanescente

DUPLICAÇÃO ATÉ MARÇO 2016

DUPLICAÇÃO - AVANÇO FÍSICO - Trecho 06 Remanescente - Km 160,000 ao Km 164,400 MG							
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
				(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	100%	100%	100%	5%	5,0%
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	35%	35%
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	35%	35%
	Base	40%	100%	40%			
	Revestimento	20%	100%	20%			
DRENAGEM		100%	100%	100%	100%	10%	10%
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	100%	50%	100%	10%	10,0%
	Segurança	50%	100%	50%			
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	100%	100%	100%	5%	5,0%
TOTAL EXECUTADO (%)							100%

Trecho 7

DUPLICAÇÃO ATÉ MARÇO 2016

DUPLICAÇÃO - AVANÇO FÍSICO - Trecho 07 - Km 24,00 ao Km 33,5 GO							
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
				(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	100%	100%	100%	5%	5%
TERRAPLENAGEM		100%	91%	91%	91%	35%	32%
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	91%	36%	90%	35%	31%
	Base	40%	91%	36%			
	Revestimento	20%	84%	17%			
DRENAGEM		100%	90%	90%	90%	10%	9%
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-			
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	38%	38%	38%	5%	2%
TOTAL EXECUTADO (%)							79%

	DOCUMENTO DE APOIO			Folha Nº:	14/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS			Data:	04/04/2016
				Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

Obras de Arte Especiais

OAE – KM 27+900/GO

INTERCONEXÃO KM 27,900 BR-040/GO - AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	100%	100%	100%	5%	5,0%	
TERRAPLENAGEM		100%	-	-	-	20%	-	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	15%	-	
	Base	40%	-	-	-			
	Revestimento	20%	-	-	-			
DRENAGEM		100%	-	-	-	10%	-	
O.A.E		100%	64%	64%	64%	40%	25,4%	
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	20%	-	-	-	5%	-	
	Segurança	40%	-	-	-			
	Iluminação	40%	-	-	-			
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								30%

OAE – KM 33+500/GO

INTERCONEXÃO KM 33,500 BR-040/GO - AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	100%	100%	100%	5%	5,0%	
TERRAPLENAGEM		100%	16%	16%	16%	20%	3,3%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	15%	-	
	Base	40%	-	-	-			
	Revestimento	20%	-	-	-			
DRENAGEM		100%	-	-	-	10%	-	
O.A.E		100%	56%	56%	56%	40%	22,3%	
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	20%	-	-	-	5%	-	
	Segurança	40%	-	-	-			
	Iluminação	40%	-	-	-			
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								31%

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	15/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001

Vias Marginais

Trecho 07 – KM 24+000/GO a 29+000/GO

DUPLICAÇÃO ATÉ MARÇO 2016

MARGINAL SUL - AVANÇO FÍSICO - TRECHO 07 - KM 24,000 ao KM 29,000 GO							
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
				(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	83%	83%	83%	5%	4%
TERRAPLENAGEM		100%	14%	14%	14%	35%	5%
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	35%	-
	Base	40%	-	-			
	Revestimento	20%	-	-			
DRENAGEM		100%	-	-	-	10%	-
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-			
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	40%	40%	40%	5%	2%
TOTAL EXECUTADO (%)							11%

DUPLICAÇÃO ATÉ MARÇO 2016

MARGINAL NORTE - AVANÇO FÍSICO - TRECHO 07 - Km 24,000 ao Km 29,000 GO							
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
				(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	82%	82%	82%	5%	4%
TERRAPLENAGEM		100%	-	-	-	35%	-
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	35%	-
	Base	40%	-	-			
	Revestimento	20%	-	-			
DRENAGEM		100%	15%	15%	15%	10%	2%
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-			
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	-	-	-	5%	-
TOTAL EXECUTADO (%)							6%

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	16/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001

Retorno em Nível – KM 71+300/GO

RETORNO EM NÍVEL ATÉ MARÇO 2016

RETORNO EM NÍVEL - AVANÇO FÍSICO - Km 71,300 GO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% PREVISTO	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
					(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	30%	30%	30%	30%	5%	1,5%
TERRAPLENAGEM		100%	-	-	-	-	35%	-
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	-	35%	-
	Base	40%	-	-	-			
	Revestimento	20%	-	-	-			
DRENAGEM		100%	-	-	-	-	10%	-
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-	-			
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	-	-	-	-	5%	-
TOTAL EXECUTADO (%)								2%

Retorno em Nível – Km 115+000/GO

RETORNO EM NÍVEL ATÉ MARÇO 2016

RETORNO EM NÍVEL - AVANÇO FÍSICO - Km 115,000 GO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% PREVISTO	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
					(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	20%	20%	20%	20%	5%	1,0%
TERRAPLENAGEM		100%	-	-	-	-	35%	-
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	-	35%	-
	Base	40%	-	-	-			
	Revestimento	20%	-	-	-			
DRENAGEM		100%	-	-	-	-	10%	-
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-	-			
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	-	-	-	-	5%	-
TOTAL EXECUTADO (%)								1%

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	17/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

Retorno em Nível – Km 122+000/GO

RETORNO EM NÍVEL ATÉ MARÇO 2016

RETORNO EM NÍVEL - AVANÇO FÍSICO - Km 122,000 GO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% PREVISTO	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
					(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	20%	20%	20%	20%	5%	1,0%
TERRAPLENAGEM		100%	-	-	-	-	35%	-
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	-	35%	-
	Base	40%	-	-	-	-		
	Revestimento	20%	-	-	-	-		
DRENAGEM		100%	-	-	-	-	10%	-
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-	-	-		
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	-	-	-	-	5%	-
TOTAL EXECUTADO (%)								1%

Retorno em Nível – Km 172+000/MG

RETORNO EM NÍVEL ATÉ MARÇO 2016

RETORNO EM NÍVEL - AVANÇO FÍSICO - Km 172,000 MG								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% PREVISTO	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%) (D)	% EXECUTADO (C) X (D)
					(A) X (B)	SOMA (C)		
SERVIÇOS PRELIMINARES (Destocamento / Limpeza)		100%	100%	100%	100%	100%	5%	5,0%
TERRAPLENAGEM		100%	8%	10%	10%	10%	35%	3,5%
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	-	35%	-
	Base	40%	-	-	-	-		
	Revestimento	20%	-	-	-	-		
DRENAGEM		100%	-	-	-	-	10%	-
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA	Sinalização	50%	-	-	-	-	10%	-
	Segurança	50%	-	-	-	-		
OBRAS COMPLEMENTARES		100%	-	-	-	-	5%	-
TOTAL EXECUTADO (%)								8,5%

  	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	18/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

Sistemas de Atendimento ao Usuário (SAUs)

BSO 1- AVANÇO FÍSICO - PARALISADO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	90%	90%	90%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	47%	47%	47%	15%	7%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	20%	-	
	Base	40%	-	-	-			
	Revestimento	20%	-	-	-			
DRENAGEM		100%	20%	20%	20%	5%	1%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	-	-	-	45%	-	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	-	-	-			
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	-	-	-			
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-	-			
	Iluminação	40%	-	-	-			
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								10%

BSO 2- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	-	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%	100%			
	Revestimento	20%	100%	20%	-			
DRENAGEM		100%	100%	100%	100%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	-	45%	45%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%	100%			
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	100%	30%	-			
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	100%	30%	-	8%	8%	
	Segurança	30%	100%	30%	100%			
	Iluminação	40%	100%	40%	-			
Obras Complementares		100%	90%	90%	90%	5%	4%	
TOTAL EXECUTADO (%)								99%

  	DOCUMENTO DE APOIO			Folha Nº:	19/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS			Data:	04/04/2016
				Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

BSO 3- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	100%	100%	100%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	100%	45%	45%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	100%	30%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	100%	30%	100%	8%	8%	
	Segurança	30%	100%	30%				
	Iluminação	40%	100%	40%				
Obras Complementares		100%	90%	90%	90%	5%	4%	
TOTAL EXECUTADO (%)								99%

BSO 4- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	100%	100%	100%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	100%	45%	45%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	100%	30%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	50%	15%	85%	8%	7%	
	Segurança	30%	100%	30%				
	Iluminação	40%	100%	40%				
Obras Complementares		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
TOTAL EXECUTADO (%)								99%

BSO 5- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	100%	100%	100%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	85%	45%	38%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	50%	15%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	17%	8%	1%	
	Segurança	30%	10%	3%				
	Iluminação	40%	35%	14%				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								82%

  	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	20/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
				DOCUMENTO N° DA.COM.001

BSO 6- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	35%	35%	35%	5%	2%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	88%	45%	40%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	60%	18%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	50%	50%	50%	5%	3%	
TOTAL EXECUTADO (%)								81%

BSO 7- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	84%	20%	17%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	20%	4%				
DRENAGEM		100%	-	-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	84%	45%	38%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	45%	14%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								71%

  	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	21/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

BSO 8- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	96%	96%	96%	15%	14%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-				
	Base	40%	-	-	-	20%	-	
	Revestimento	20%	-	-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%				
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%	76%	45%	34%	
	Acabam. /Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	20%	6%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-				
	Segurança	30%	-	-	-	8%	-	
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								51%

BSO 9- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%				
	Base	40%	35%	14%	54%	20%	11%	
	Revestimento	20%	-	-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%				
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%	79%	45%	36%	
	Acabam. /Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	30%	9%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-				
	Segurança	30%	-	-	-	8%	-	
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								63%

BSO 10- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	90%	90%	90%	15%	14%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-				
	Base	40%	-	-	-	20%	-	
	Revestimento	20%	-	-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%				
	Est. Metálica ou cobertura	20%	46%	9%	67%	45%	30%	
	Acabam. /Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	25%	8%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-				
	Segurança	30%	-	-	-	8%	-	
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								46%

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	22/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
			DOCUMENTO N° DA.COM.001	

BSO 11- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	99%	45%	44%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	95%	29%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	20%	6%	69%	8%	6%	
	Segurança	30%	90%	27%				
	Iluminação	40%	90%	36%				
Obras Complementares		100%	90%	90%	90%	5%	5%	
TOTAL EXECUTADO (%)								96%

BSO 12- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	99%	45%	44%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	95%	29%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	20%	6%	73%	8%	6%	
	Segurança	30%	90%	27%				
	Iluminação	40%	100%	40%				
Obras Complementares		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
TOTAL EXECUTADO (%)								97%

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	23/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
			DOCUMENTO N° DA.COM.001	

BSO 13- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB- ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	75%	30%	30%	20%	6%	
	Base	40%		-				
	Revestimento	20%		-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	73%	45%	33%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam./Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	10%	3%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								56%

BSO 14- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB- ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	30%	12%	12%	20%	2%	
	Base	40%	-	-				
	Revestimento	20%	-	-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	64%	45%	29%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	46%	9%				
	Acabam./Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	15%	5%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								48%

	DOCUMENTO DE APOIO				Folha Nº:	24/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS				Data:	04/04/2016
					Nº da Revisão:	00
					DOCUMENTO Nº DA.COM.001	

BSO 15- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	90%	90%	90%	15%	14%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	20%	-	
	Base	40%	-	-				
	Revestimento	20%	-	-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	73%	45%	33%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	10%	3%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								48%

BSO 16- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	99%	45%	44%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	95%	29%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%		-	25%	8%	2%	
	Segurança	30%	30%	9%				
	Iluminação	40%	40%	16%				
Obras Complementares		100%	30%	30%	30%	5%	2%	
TOTAL EXECUTADO (%)								90%

BSO 17- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB-ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	96%	96%	96%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	99%	45%	44%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét/Hidr./Poço art.	30%	96%	29%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	20%	6%	65%	8%	5%	
	Segurança	30%	90%	27%				
	Iluminação	40%	80%	32%				
Obras Complementares		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
TOTAL EXECUTADO (%)								96%

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	25/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001

BSO 18- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB- ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	88%	88%	88%	15%	13%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	-	-	-	20%	-	
	Base	40%	-	-				
	Revestimento	20%	-	-				
DRENAGEM		100%	65%	65%	65%	5%	3%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	88%	45%	40%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	60%	18%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								58%

BSO 19- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB- ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	90%	90%	90%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	99%	45%	44%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	95%	29%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	48%	8%	4%	
	Segurança	30%	80%	24%				
	Iluminação	40%	60%	24%				
Obras Complementares		100%	80%	80%	80%	5%	4%	
TOTAL EXECUTADO (%)								94%

  	DOCUMENTO DE APOIO		Folha N°:	26/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			N° da Revisão:	00
				DOCUMENTO N° DA.COM.001

BSO 20- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB- ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%	100%	100%	100%	2%	2%	
TERRAPLENAGEM		100%	100%	100%	100%	15%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%	100%	40%	100%	20%	20%	
	Base	40%	100%	40%				
	Revestimento	20%	100%	20%				
DRENAGEM		100%	100%	100%	100%	5%	5%	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	100%	50%	99%	45%	44%	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	100%	20%				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	95%	29%				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	20%	6%	63%	8%	5%	
	Segurança	30%	75%	23%				
	Iluminação	40%	85%	34%				
Obras Complementares		100%	95%	95%	95%	5%	5%	
TOTAL EXECUTADO (%)								96%

BSO 21- AVANÇO FÍSICO								
ATIVIDADE	SUB-ATIVIDADE	PESO SUB- ATIVIDADE (A)	% EXECUTADO (B)	TOTAL EXECUTADO		PESO ATIVIDADE (%)	% EXECUTADO (C) X (D)	
				(A) X (B)	SOMA (C)			
SERVIÇOS PRELIMINARES		100%		-	-	2%	-	
TERRAPLENAGEM		100%		-	-	15%	-	
PAVIMENTAÇÃO	Sub-Base	40%		-	-	20%	-	
	Base	40%		-				
	Revestimento	20%		-				
DRENAGEM		100%		-	-	5%	-	
OBRAS CIVIS	Prédio	50%	-	-	-	45%	-	
	Est. Metálica ou cobertura	20%	-	-				
	Acabam. /Inst. Elét./Hidr./Poço art.	30%	-	-				
SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO	Sinalização	30%	-	-	-	8%	-	
	Segurança	30%	-	-				
	Iluminação	40%	-	-				
Obras Complementares		100%	-	-	-	5%	-	
TOTAL EXECUTADO (%)								-

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	27/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº	DA.COM.001

4. Relatório Fotográfico

	
<p><i>Execução de CBUQ no encaixe – Km 164+300/MG</i></p>	<p><i>Execução de drenagem no canteiro central - Km 164+300/MG</i></p>
	
<p><i>Plantio de grama esmeralda - Km 162+800/MG</i></p>	<p><i>Duplicação Concluída – Km 160+000/MG ao Km 164+400/MG</i></p>
	

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	28/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
				DOCUMENTO Nº DA.COM.001

<i>Base imprimada - Km 27+880/GO</i>	<i>Corpo de aterro e reforço no subleito na marginal sul - Km 24+800/GO - Km 25+140/GO</i>
--------------------------------------	--



Placas de aviso de obra – Retorno em nível: Km 71+300/GO, Km 115+000/GO, Km 122+000/GO;

Fundo rebaixado ao greide - Retorno em nível: Km 172+000/MG



SAU 3 – Entrega para operações

SAU 2 – Entrega para operações

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	29/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	



SAU 5 – Compactação BGS



SAU 4 – Entrega para operações



SAU 6 – Execução da cobertura metálica



SAU 8 – Terraplenagem do taper de acesso



SAU 9 – Edificação concluída e execução da cobertura metálica



SAU 10 – Montagem da edificação e terraplenagem

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	30/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	



SAU 11 – Entrega para operações



SAU 12 – Execução de gradil



SAU 13 – Montagem da edificação e cobertura metálica



SAU 14 - Montagem da edificação



SAU 15 - Montagem da cobertura metálica



SAU 16 – Execução de piso intertravado

	DOCUMENTO DE APOIO		Folha Nº:	31/31
	RELATORIO JORNALISTICO MENSAL DE PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS		Data:	04/04/2016
			Nº da Revisão:	00
			DOCUMENTO Nº DA.COM.001	



SAU 17: Instalação das luminárias nos postes



SAU 18 – Execução de sub-base e base



SAU 19 – Execução de drenagem



SAU 20: Entrega para operações

5. Considerações Finais

A concessão tem prazo contratual de 30 anos e prevê a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de um dos principais corredores rodoviários do Brasil. O percurso compreende 35 municípios cuja população estimada é de 8 milhões de habitantes.

6. Termo de Encerramento

O presente relatório mensal se completa com 30 (trinta) folhas devidamente identificadas e numeradas.
