

# RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** **VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A**
- **RODOVIA:** **BR-324/BA; BR-116/BA**  
**BA-526; BA-528**
- **TRECHO:** **SALVADOR – FEIRA DE SANTANA**  
**FEIRA DE SANTANA – DIVISA. BA/MG**
- **EXTENSÃO:** **680,6 KM**

**SALVADOR – BA**

**SETEMBRO DE 2017**

## – ÍNDICE –

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
1.	Informações da Concessão .....	3
1.1.	Introdução .....	3
1.2.	Informações Contratuais .....	5
1.3.	Mapa de Situação .....	7
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras.....	8
2.1.	Descrição das Principais das Obras .....	8
2.2.	Localização das Obras .....	9
2.3.	Marcos Contratuais .....	10
2.4.	Relação de Equipamento e Pessoal.....	11
3.	Relatório Fotográfico .....	12
4.	Considerações Finais .....	16
5.	Termo de Encerramento.....	17

## **1. Informações da Concessão**

A VIABAHIA tem como objetivo a concessão da exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, por 25 anos. Essas atividades deverão oferecer serviços de alta qualidade garantindo a segurança, conforto e fluidez do tráfego para os usuários, respeitando o meio ambiente, interagindo com a comunidade lindeira das rodovias.

### **1.1. Introdução**

Desde o dia 19 de outubro de 2009, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A, é responsável pela administração e operação de 554,132 km da BR-116/BA de Feira de Santana a divisa BA/MG, 113,233 km da BR-324/BA de Salvador a Feira de Santana, 9,3 km da BA-526 da entrada da BR-324 a entrada da BA-528 e 4,0 km da BA-528 da entrada BA-526 até o acesso Base Naval de Aratu.

O presente relatório tem como objetivo divulgar através do site da Agência Reguladora as informações sobre as principais obras desempenhadas pela Concessionária.

Principais canais de comunicação com a concessionária são:

#### **Serviço de Atendimento ao Usuário:**

0800 6000 116

0800 6000 324

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 8000 888

#### **Endereço Eletrônico:**

[www.viabahiasa.com.br](http://www.viabahiasa.com.br)

## **Missão**

Garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços ao longo das rodovias concedidas, com consciência ambiental, mantendo um excelente relacionamento com os usuários e seus colaboradores, e atendendo as expectativas dos seus acionistas.

## **Visão**

Ser referência no gerenciamento rodoviário do Nordeste, modernizando as rodovias sob sua concessão, protegendo o meio ambiente, adotando padrões de qualidade, segurança e conforto que atendam os interesses das partes relacionadas.

## **Valores**

- Aplicar o código de Ética;
- Cordialidade e cooperação;
- Transparência nas relações;
- Esmero no atendimento;
- Aperfeiçoamento profissional;
- Responsabilidade na execução das tarefas;
- Maximização dos resultados;
- Consciência Ambiental;
- Padrão de Qualidade.

A Concessionária encontra-se no 8.º Ano de Concessão, desempenhando o Investimento de Recuperação, realizando as obras de cunho estrutural no pavimento e de melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

## 1.2. Informações Contratuais

BR-116/BA – Feira de Santana à Divisa BA/MG - 554,1 km de extensão (km 420+300 ao km 936+800 – PNV 2003)

BR-324/BA – Salvador à Feira de Santana - 113,2 km de extensão (km 512+600 ao km 626+200 – PNV 2003)

BA- 526 – Entroncamento BR-324 ao Entroncamento BA-528 - 9,3 km de extensão

BA-528 – Entroncamento BA-526 ao Acesso Base Naval de Aratu - 4 km de extensão

**Edital n.º:** 001/08

**Data de assinatura do contrato:** 03/09/2009

**Data do extrato do contrato em DOU:** 04/09/2009

**Data de Assunção:** 19/10/2009 (publicação em DOU do Termo de Arrolamento e Transferência pelo DNIT)

**Data base do contrato:** Dezembro/2005

**Valor TBP Inicial:** R\$ 2,212 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$ 1,261 (praças P01 e P02).

**Valor TBP Vigente:** R\$ 4,50 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$ 2,50 (praças P01 e P02).

**IRT vigente:** 1,89169

**Concessionária:** VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A

Telefone/Fax: 00 55 71 3025-9800; endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 3244 – 16º Andar; Sala 1600 – Bairro: Caminho das Árvores, CEP 41800-700 Salvador/BA; e-mail para contato: [ouvidoria@viabahiasa.com.br](mailto:ouvidoria@viabahiasa.com.br); sítio eletrônico [www.viabahiasa.com.br](http://www.viabahiasa.com.br).

*Tabela 01 – Dados Contratuais*

<b>DADOS CONTRATUAIS</b>	
<b>Concessionária</b>	VIABAHIA Concessionária de Rodovias AS
<b>Contrato Nº</b>	Edital n.º 001/2008
<b>Escopo do Contrato</b>	Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e a Exploração da Rodovia e Respetivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio
<b>Data da Assinatura do Contrato</b>	03/09/2009
<b>Data de Início da Concessão</b>	20/10/2009
<b>Início da Cobrança de Pedágio</b>	07/12/2010
<b>Rodovia</b>	BR-324/BA;BR-116/BA;BA-526 e BA-528
<b>Trecho</b>	Salvador - Feira de Santana e Feira de Santana - Div. BA/MG
<b>Extensão (km)</b>	680,60
<b>Prazo</b>	25 anos

### 1.3. Mapa de Situação

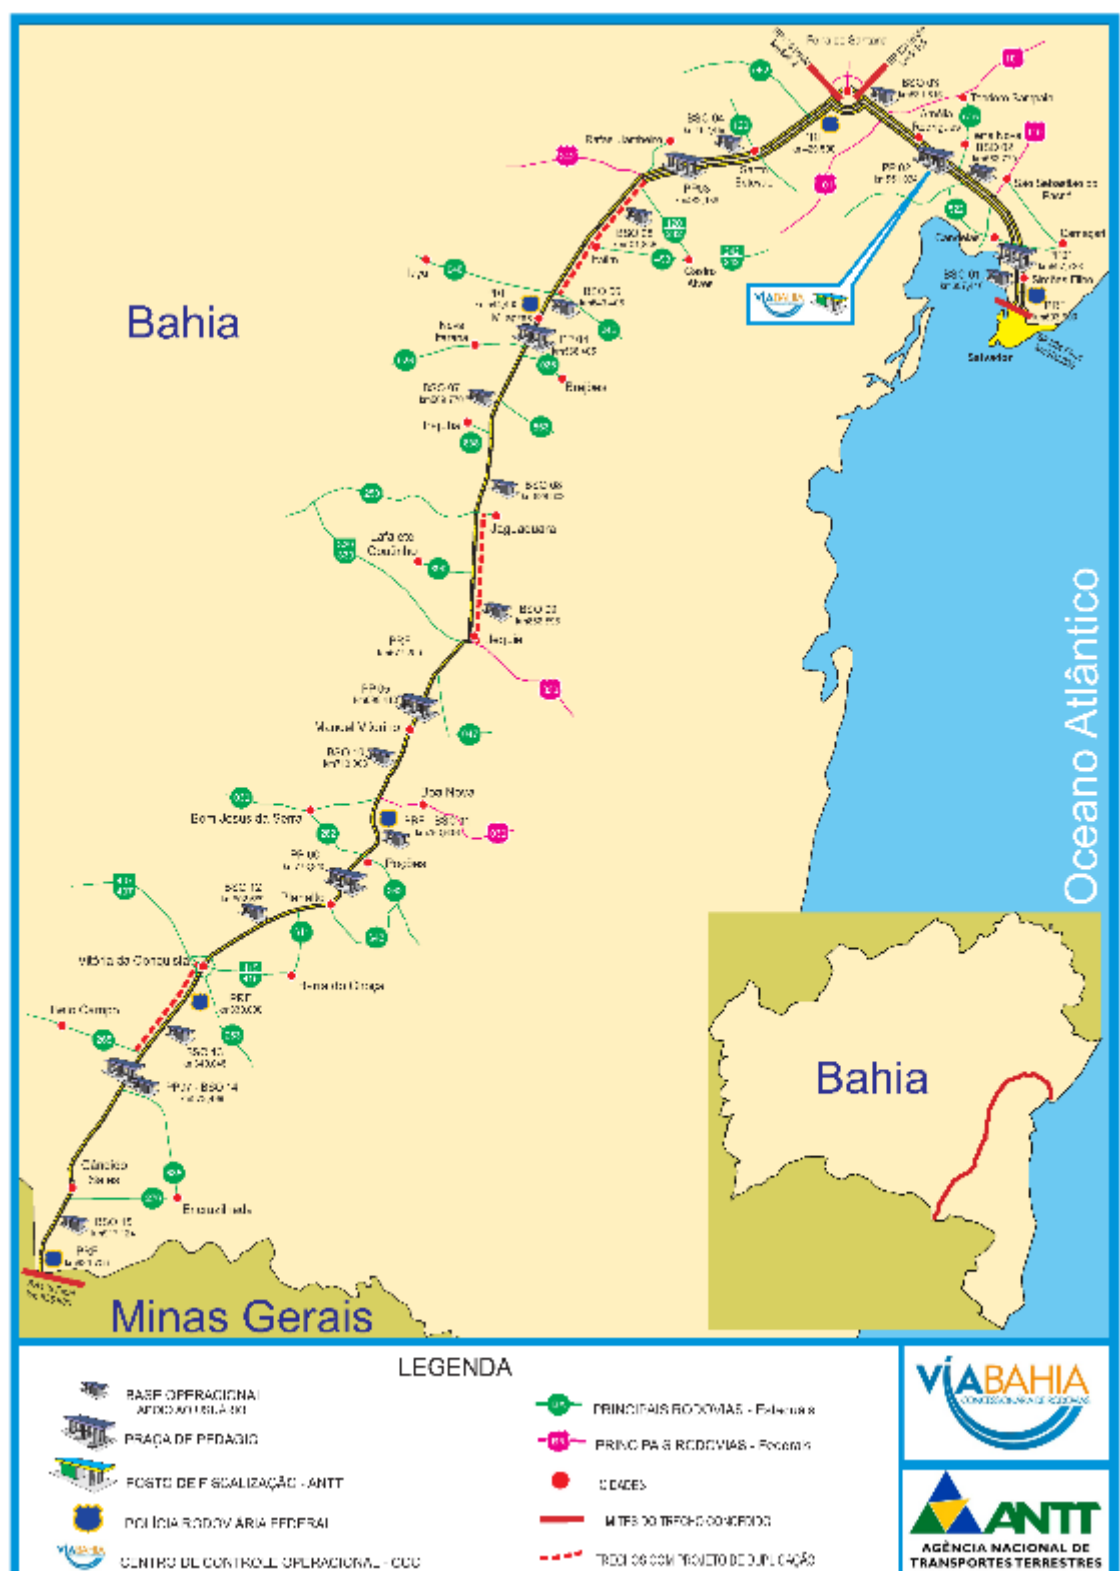


Figura 01 – Mapa de Situação

## 2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras


### 2.1. Descrição das Principais das Obras

- **Elementos de Proteção e Segurança:** Continua a execução dos serviços de recuperação de Elementos de Proteção e Segurança, com a implantação de Defensas Metálicas, de Sinalização Horizontal e Vertical, através da instalação de placas, delineadores, tachas refletivas e implantação de pinturas refletivas (faixas de eixos e bordos).
- **Obras de Arte Especiais:** Em andamento obras de Alargamento e Reforço Estrutural das Obras de Arte na BR-324 e BR-116.
- **Terrapleno e Estrutura de Contenção:** Em andamento obras de recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção.
- **Implantação de Passarelas:** Em andamento obras de Implantação de Passarela.
- **Outras Melhorias:** Em andamento obras de Outras Melhorias.




## 2.2. Localização das Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras

 <b>ACOMPANHAMENTO OBRAS</b>			
Item PER	Descrição da Obra	Status	
<b>2</b>	<b>RECUPERAÇÃO</b>		
<b>2.3</b>	<b>Obras de Arte Especiais</b>		
	BR-116 - km 495+000 - Recuperação de ponte	Andamento	●
<b>2.5</b>	<b>Terraplenos e Estruturas de Contenção</b>		
	BR-324 - km 597+000 - Pista Leste	Paralisada	●
<b>6</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS</b>		
<b>6.1.1</b>	<b>Duplicação</b>		
	Duplicação	Paralisada	●
<b>6.1.2.2</b>	<b>Implantação de Passarelas para Pedestres</b>		
	BR-116 - km 464+800 - SANTO ESTEVÃO - PORTO BRASIL	Paralisada	●
	BR-324 - km 545+000 - AMÉLIA RODRIGUES	Paralisada	●
	<b>OUTRAS MELHORIAS</b>		
	BR-116 - KM 495+100 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA PONTE DO PARAGUAÇU	Andamento	●

## 2.3. Marcos Contratuais

*Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais*

 <b>LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS</b>			
<b>Marco</b>	<b>Descrição</b>	<b>MESES</b>	<b>DATA</b>
1	MONITORAÇÃO	3 MESES	Jan/17
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO	6 MESES	Jul/17
3	ANTT APROVA PROJETO	2 MESES	Set/17
4	CONTRATA EXECUÇÃO DE OBRA	1 MÊS	Out/17
5	EXECUÇÃO DA OBRA	1 ANO	Out/18

## 2.4. Relação de Equipamento e Pessoal

*Tabela 04 – Relação de Equipamentos e Recursos*

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>Pessoal</b>	
1.1	Administração Sede	95
1.2	Administração Local	80
1.3	Operacional	424
<b>Total</b>		<b>599</b>

### 3. Relatório Fotográfico

- BR-116 – Recuperação de Obra de arte no km 495+500 - Ponte do Paraguaçu.







- BR-116 - Implantação da nova Ponte do Paraguaçu - km 495+100.







#### 4. Considerações Finais

- *No aludido documento, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A (VIABAHIA) encaminha todas as informações solicitadas pela União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e comunica aos usuários das rodovias concedidas, através dos referidos endereços eletrônicos sobre o andamento das principais obras desenvolvidas por esta Concessionária.*
- *Referências: Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014, n.º 056/2014/SUINF, Ofício Circular n.º 011/2015/SUINF, n.º 049/2015/SUINF e n.º 075/2015/SUINF.*



## 5. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 18 (dezoito) folhas devidamente identificadas e numeradas.
