

RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** **VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A**
- **RODOVIA:** **BR-324/BA; BR-116/BA**
BA-526; BA-528
- **TRECHO:** **SALVADOR – FEIRA DE SANTANA**
FEIRA DE SANTANA – DIV. BA/MG
- **EXTENSÃO:** **680,5 KM**

SALVADOR – BA

FEVEREIRO DE 2016

– ÍNDICE –

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.	Informações da Concessão	3
1.1.	Introdução	3
1.2.	Informações Contratuais	5
1.3.	Mapa de Situação.....	7
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras	8
2.1.	Descrição das Principais das Obras.....	8
2.2.	<i>Localização das Obras</i>	9
2.3.	Marcos Contratuais	11
2.4.	Relação de Equipamento e Pessoal.....	12
3.	Relatório Fotográfico	13
4.	Considerações Finais	22
5.	Termo de Encerramento.....	23

1. Informações da Concessão

A VIABAHIA tem como objetivo a concessão da exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, por 25 anos. Essas atividades deverão oferecer serviços de alta qualidade garantindo a segurança, conforto e fluidez do tráfego para os usuários, respeitando o meio ambiente, interagindo com a comunidade lindeira das rodovias.

1.1. Introdução

Desde o dia 19 de outubro de 2009, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A, é responsável pela administração e operação de 554,132 km da BR-116/BA de Feira de Santana a divisa BA/MG, 113,233 km da BR-324/BA de Salvador a Feira de Santana, 9,3 km da BA-526 da entrada da BR-324 a entrada da BA-528 e 4,0 km da BA-528 da entrada BA-526 até o acesso Base Naval de Aratu.

O presente relatório tem como objetivo divulgar através do site da Agência Reguladora as informações sobre as principais obras desempenhadas pela Concessionária.

Principais canais de comunicação com a concessionária são:

Serviço de Atendimento ao Usuário:

0800 6000 116

0800 6000 324

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 8000 888

Endereço Eletrônico:

www.viabahiasa.com.br

Missão

Garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços ao longo das rodovias concedidas, com consciência ambiental, mantendo um excelente relacionamento com os usuários e seus colaboradores, e atendendo as expectativas dos seus acionistas.

Visão

Ser referência no gerenciamento rodoviário do Nordeste, modernizando as rodovias sob sua concessão, protegendo o meio ambiente, adotando padrões de qualidade, segurança e conforto que atendam os interesses das partes relacionadas.

Valores

- Aplicar o código de Ética;
- Cordialidade e cooperação;
- Transparência nas relações;
- Esmero no atendimento;
- Aperfeiçoamento profissional;
- Responsabilidade na execução das tarefas;
- Maximização dos resultados;
- Consciência Ambiental;
- Padrão de Qualidade.

A Concessionária encontra-se no 6.º Ano de Concessão, desempenhando o Investimento de Recuperação, realizando as obras de cunho estrutural no pavimento e de melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

1.2. Informações Contratuais

BR-116/BA – Feira de Santana à Divisa BA/MG - 554,1 km de extensão (km 420+300 ao km 936+800 – PNV 2003)

BR-324/BA – Salvador à Feira de Santana - 113,2 km de extensão (km 512+600 ao km 626+200 – PNV 2003)

BA- 526 – Entroncamento BR-324 ao Entroncamento BA-528 - 9,3 km de extensão

BA-528 – Entroncamento BA-526 ao Acesso Base Naval de Aratu - 4 km de extensão

Edital n.º: 001/08

Data de assinatura do contrato: 03/09/2009

Data do extrato do contrato em DOU: 04/09/2009

Data de Assunção: 19/10/2009 (publicação em DOU do Termo de Arrolamento e Transferência pelo DNIT)

Data base do contrato: Dezembro/2005

Valor TBP Inicial: R\$ 2,30975 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$ 1,3165 (praças P01 e P02).

Valor TBP Vigente: R\$ 3,70 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$ 2,10 (praças P01 e P02).

IRT vigente: 1,75362

Concessionária: VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A

Telefone/Fax: 00 55 71 3025-9800; endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 3244 – 16º Andar; Sala 1600 – Bairro: Caminho das Árvores, CEP 41800-700 Salvador/BA; e-mail para contato:

ouvidoria@viabahiasa.com.br;

sítio

eletrônico

www.viabahiasa.com.br.

Tabela 01 – Dados Contratuais

DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	VIABAHIA Concessionária de Rodovias AS
Contrato N°	Editais n.º 001/2008
Escopo do Contrato	Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e a Exploração da Rodovia e Respetivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio
Data da Assinatura do Contrato	03/09/2009
Data de Início da Concessão	20/10/2009
Início da Cobrança de Pedágio	07/12/2010
Rodovia	BR-324/BA;BR-116/BA;BA-526 e BA-528
Trecho	Salvador - Feira de Santana e Feira de Santana - Div. BA/MG
Extensão (km)	680,60
Prazo	25 anos

1.3. Mapa de Situação

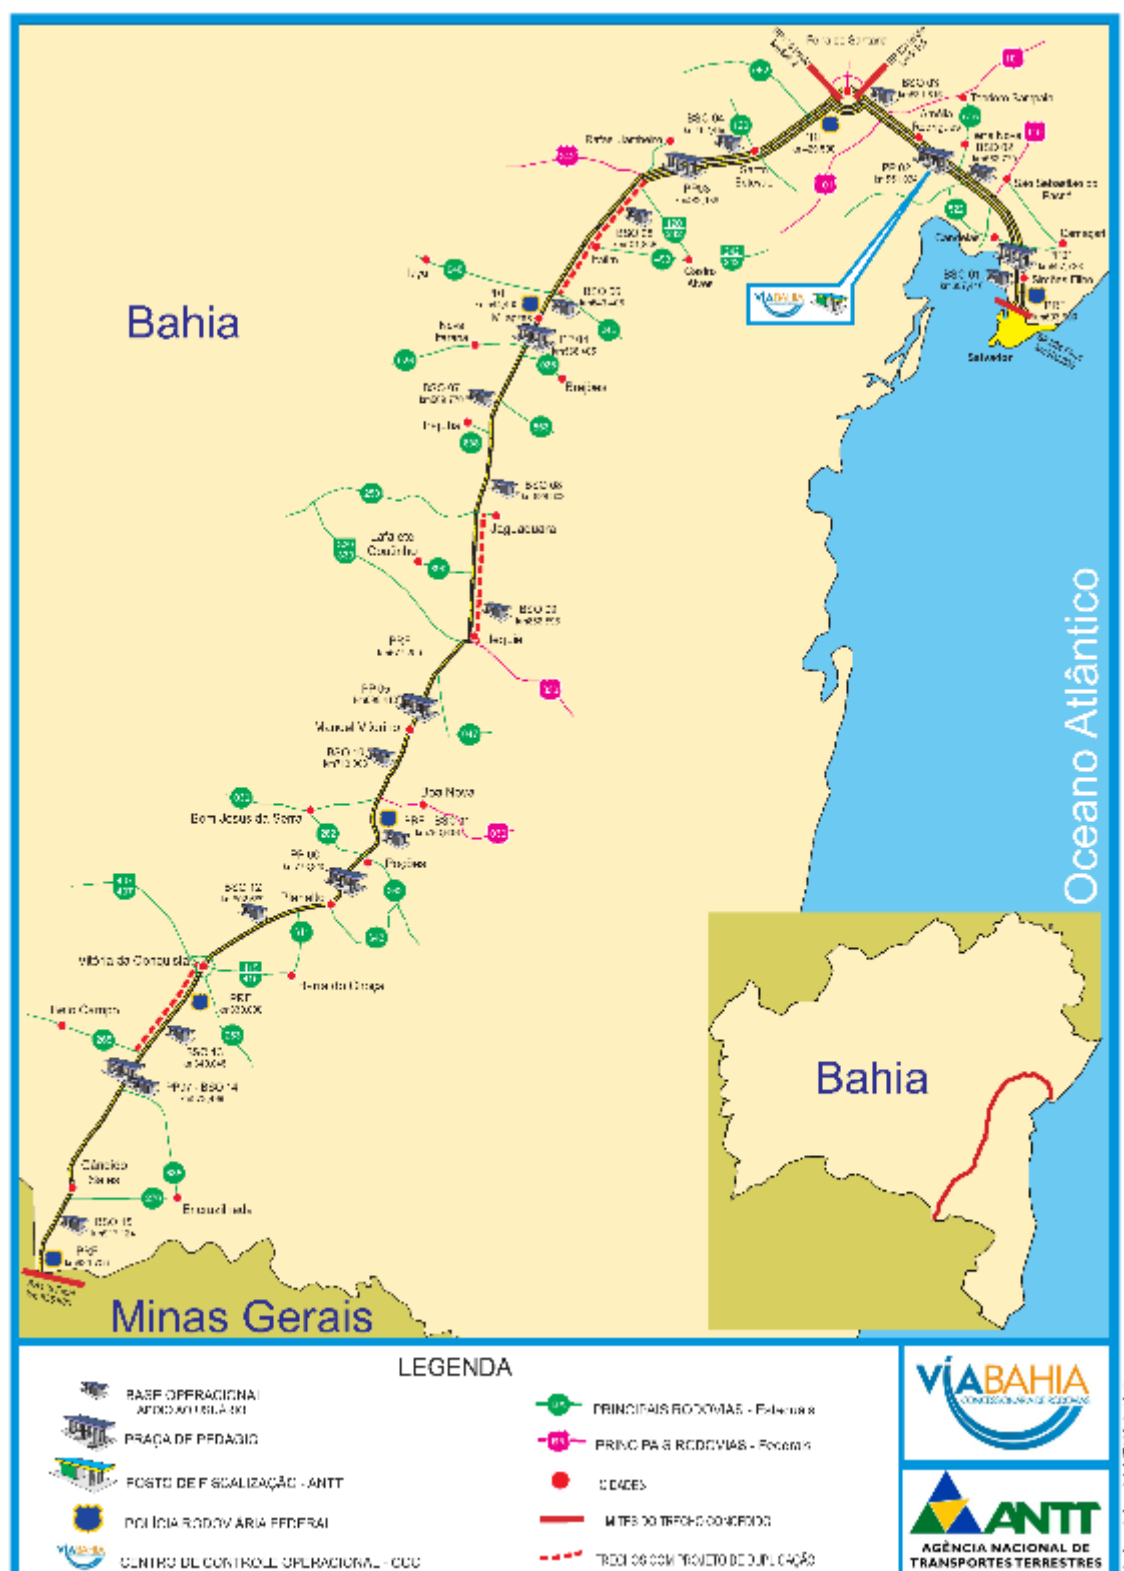


Figura 01 – Mapa de Situação

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1. Descrição das Principais das Obras

- **Pavimento:** Continuam as obras de recuperação de Pavimento nas rodovias BR-324 e BR-116, com execução dos serviços de Fresagem Recomposição com CBUQ e implantação de Drenagem Profunda.
- **Elementos de Proteção e Segurança:** Continua a execução dos serviços de recuperação de Elementos de Proteção e Segurança, com a implantação de Defensas Metálicas, de Sinalização Horizontal e Vertical, através da instalação de placas, delineadores, tachas refletivas e implantação de pinturas refletivas (faixas de eixos e bordos).
- **Obras de Arte Especiais:** Em andamento obras de Alargamento e Reforço Estrutural das Obras de Arte na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas de Drenagem e Obras-de-arte Correntes:** Está em andamento a implantação de drenagem superficial (sarjetas/canaletas), e a recuperação das obras de arte corrente na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas Elétricos e de Iluminação:** Concluídas as obras de Implantação de Iluminação.
- Continuam as obras de **Duplicação** com execução dos serviços de Drenagem, de Obras de Arte Especiais, Terraplenagem, Pavimentação, Iluminação e remanejamento de interferências
- A partir da definição da localização das passarelas a serem implantadas no Sistema Rodoviário, a VIABAHIA deu início à elaboração e envio à Agência dos projetos necessários. Foram aprovados 38 locais para implantação de passarelas.

2.2. Localização das Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras

 ACOMPANHAMENTO OBRAS			
Item PER	Descrição da Obra	Status	
2	RECUPERAÇÃO		
2.1	Pavimento		
	BR-324 - km 518+000 ao 522+000 - Oeste - Fresagem e Recomposição	Concluída	●
	BR-324 - km 521+000 ao 521+500 - Oeste - Acostamento/ Reconstrução	Andamento	●
	BR-324 - km 523+000 ao 524+000 - Leste - Fresagem e Recomposição	Andamento	●
	BR-116 - km 582+000 ao 585+000 - Norte/Sul - Fresagem e Recomposição	Concluída	●
	BR-116 - km 548+300 ao 549+800 - Sul - Fresagem e Recomposição	Andamento	●
	BR-116 - km 815+000 ao 817+000 - Norte/Sul - Fresagem e Recomposição	Andamento	●
2.3	Obras de Arte Especiais		
	BR-324 - km 621+300 - Recuperação de Passarela (622+300)	Andamento	●
	BR-324 - km 619+550 - Recuperação de Passarela (620+300)	Andamento	●
	BR-324 - km 612+450 - Recuperação de Passarela	Concluída	●
	BR-324 - km 572+000 - Ponte - Oeste	Andamento	●
	BR-324 - km 553+720 - Passagem Inferior - Oeste	Andamento	●
	BR-116 - km 431+760 - Viaduto	Andamento	●
2.4	Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Correntes		
	BR-324 - km 624+000 ao 617+000 - Leste/oeste - Recuperação de sistema de drenagem	Andamento	●
	BR-324 - km 551+000 - Recuperação de sistema de drenagem	Concluída	●
	BR-324 - km 619+500 - Recuperação de drenagem em Porto Seco Pirajá	Andamento	●

ACOMPANHAMENTO OBRAS

Item PER	Descrição da Obra	Status
2.5	Terraplenos e Estruturas de Contenção	
	BR-324 - km 554+590 - Pista Oeste	Concluída ●
	BR-324 - km 555+500 - Pista Oeste	Andamento ●
	BR-324 - km 586+400 - Pista Leste	Andamento ●
	BR-324 - km 597+400 - Pista Leste	Andamento ●
	BR-324 - km 607+080 - Pista Oeste	Concluída ●
	BR-324 - km 614+400 - Pista Leste	Andamento ●
	BR-116 - km 427+600 - Norte	Andamento ●
	BR-116 - km 478+120 - Norte/Sul	Andamento ●
	BR-116 - km 776+500 - Norte/Sul	Andamento ●
	BR-116 - km 845+580 - Norte/Sul	Andamento ●
2.6	Recuperação de Canteiro Central e Faixa de Domínio	
	BR-324- km 562+200 ao 560+400 - Oeste - Implantação de cerca na Faixa de domínio	Andamento ●
	BR-116- km 452+000 ao 453+000 - Norte/Sul - Implantação de cerca na Faixa de domínio	Andamento ●
	BR-116- km 477+000 ao 478+000 - Norte/Sul - Implantação de cerca na Faixa de domínio	Andamento ●
	BR-116- km 495+100 ao 495+500 - Norte/Sul - Implantação de cerca na Faixa de domínio	Andamento ●
6	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS	
6.1.1	Duplicação	
	Duplicação	Andamento ●
6.1.2.2	Implantação de Passarelas para Pedestres	
	BR-324 - km 617+750 - SALVADOR - MAKRO / PERDIGÃO - PORTO SECO PIRAJÁ	Andamento ●
	BR-324 - km 615+100 - SALVADOR	Concluída ●
	BR-324 - km 589+000 - CANDEIAS - COMUNIDADE BOCA DA MATA	Andamento ●
	BR-324 - km 542+350 - AMÉLIA RODRIGUES	Concluída ●
	BR-324 - km 539+000 - SANTO AMARO	Andamento ●
	BR-324 - km 523+350 - ACESSO LIMOIEIRO	Andamento ●
	BR-324 - km 521+200 - FEIRA DE SANTANA - IFBA	Concluída ●
	BR-116 - km 430+700 - POVOADO DO Km 7	Concluída ●
	BR-116 - km 459+500 - SANTO ESTEVÃO - POSTO PAU DE VELA	Concluída ●
	BR-116 - km 465+950 - SANTO ESTEVÃO - CABEÇA DE VACA	Andamento ●
	BR-116 - km 473+000 - SANTO ESTEVÃO - COMUNIDADE DO KM 50	Andamento ●
	BR-116 - km 484+100 - POVOADO DO MARACANÃ	Concluída ●
	BR-324 - km 545+000 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE AMÉLIA RODRIGUES	Concluída ●
	CONTORNO SUL DE FEIRA DE SANTANA - ADEQUAÇÃO DA ALÇA DE ACESSO A BR - 116/SUL NO KM 7+000	Andamento ●
	CONTORNO SUL DE FEIRA DE SANTANA - km 0+000 ao 1+000 - REFORMA DOS MUROS E GUARITA DO 35º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FEIRA DE SANTANA - KM	Andamento ●
	ALARGAMENTO DA ALÇA DE ACESSO À BR-324 DO VIADUTO PORTAL DO SERTÃO	Andamento ●
	BR-116 - KM 431+800 - IMPLANTAÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO Á ESTRADA DO FEIJÃO	Andamento ●
	BR-324 - KM 604+700 - MELHORIAS VIÁRIAS EM SIMOES FILHO	Andamento ●

2.3. Marcos Contratuais

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais

 LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS			
Marco	Descrição	MESES	DATA
1	MONITORAÇÃO	4 MESES	out/14
2	ANTT APROVA MONITORAÇÃO	2 MESES	dez/14
3	CONTRATAÇÃO DE PROJETO	2 MESES	fev/15
	Elaboração de Termo de Referência		
	Elaboração e Emissão de Carta-Convite		
	Recebimento Propostas e Esclarecimentos		
	Elaboração de Quadro Comparativo - Equalização		
	Negociação e Aprovação pela Diretoria		
	Elaboração e Assinatura de Contrato		
	Emissão de Ordem de Serviço - O.S.		
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO	4 MESES	jun/15
5	ANTT APROVA PROJETO	2 MESES	ago/15
6	CONTRATA EXECUÇÃO DE OBRA	1 MÊS	set/15
	Elaboração de Termo de Referência		
	Elaboração e Emissão de Carta-Convite		
	Recebimento Propostas e Esclarecimentos		
	Elaboração de Quadro Comparativo - Equalização		
	Negociação e Aprovação pela Diretoria		
	Elaboração e Assinatura de Contrato		
	Emissão de Ordem de Serviço - O.S.		
7	EXECUÇÃO DA OBRA	6 MESES	out/14

2.4. Relação de Equipamento e Pessoal

Tabela 04

– Relação de Equipamentos e Recursos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL		
Item	Descrição	Quantidade
1	Pessoal	
1.1	Administração Central	66
1.2	Administração Local	204
1.3	Operacional	522
Total		792
2	Equipamentos	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	17
2.2	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	13
2.3	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	2
2.4	Guinchos Leves	11
2.5	Guincho Pesado	4
2.6	Caminhão Pipa	3
2.7	Caminhão para apreensão de animais	3
Total		53

3. Relatório Fotográfico

- BR-324 - Recuperação de Pavimento no km 518+600 ao 518+970 –
Recuperação do pavimento.



- BR-116 – Recuperação de Pavimento no km 582+000 – Fresagem e recomposição em CBUQ.



- BR-324 - Recuperação de Obra de Arte Especial no km 572+000 – Passagem Inferior.



- BR-324 - Recuperação de Obra de Arte Especial no km 553+000 – Passagem Inferior.



- BR-324 - Recuperação de sistema de drenagem no km 624+000 ao 617+000/ Sentido Leste/oeste.



- BR-324 - Recuperação de Terrapleno no km 586+400/ Sentido Leste.



- BR-324 - Recuperação de Terrapleno no km 597+400/ Sentido Leste.



- BR-116 - Recuperação de Terrapleno no km 478+120/ Sentido Norte/Sul.



- BR-324, Implantação cerca em faixa de domínio no km 562+200 ao 560+400.



- BR-324, Implantação de Passarela no km 539+000.



- BR-324, Implantação de Passarela no km 523+350.



- Contorno Sul de Feira de Santana - Implantação de Passarela no km 1+900.



- BR-116, Implantação de Passarela no km 465+950.



- Rotatória do Contorno de Feira de Santana - Construção das novas alças do viaduto do km 0+000.



- CONTORNO SUL DE FEIRA DE SANTANA - km 0+000 ao 1+000 - REFORMA DOS MUROS E GUARITA DO 35º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FEIRA DE SANTANA.



4. Considerações Finais

- *No aludido documento, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A (VIABAHIA) encaminha todas as informações solicitadas pela União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e comunica aos usuários das rodovias concedidas, através dos referidos endereços eletrônicos sobre o andamento das principais obras desenvolvidas por esta Concessionária.*
- *Referências: Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014, n.º 056/2014/SUINF, Ofício Circular n.º 011/2015/SUINF e Ofício Circular n.º 075/2015/SUINF.*

5. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 23 (*vinte e três*) folhas devidamente identificadas e numeradas.
